


Obs.: As US01, US02, US03, US04 estão na etapa de análise para garantir que as telas continuem funcionando apenas com a configuração no sistema de um novo CD.

Listagem de Histórias	Estimativa Dev.		Estimativa QA		Total	
	Original	Real	Original	Real	Original	Real
US01 - Adaptar calculo do cross e abastecimento	Não se aplica		Não se aplica		Não se aplica	
US02 - Cálculo da duração de estoque (Compras)	Não se aplica		Não se aplica		Não se aplica	
US03 - Consultas gerais de estoque	Não se aplica		Não se aplica		Não se aplica	
US04 - Análise Mercadológica de estoque	Não se aplica		Não se aplica		Não se aplica	
US05 – Jobs	17	9	0	0	17	9
US06 - Levantar todos pontos com Loja fixa	45	11,5	81	0	126	11,5
Total:	62	20,5	81	0	143	20,5

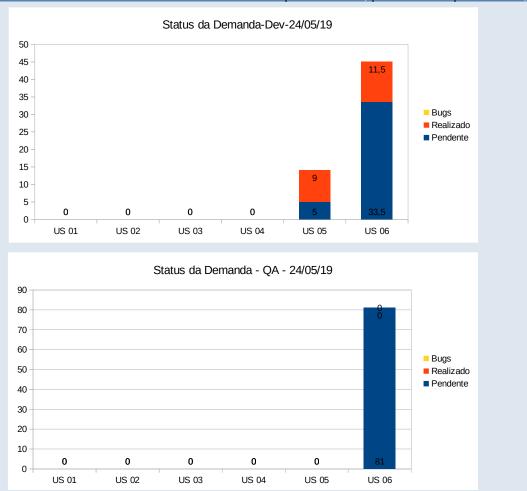

Riscos

- Durante a fase de análise, varios pontos no sistemas ficarão inalterados tecnicamente porque serão conduzidos via processo (vide Documento Unico do projeto)
- A data de entrega pode sofrer alteração caso exista outros pontos no sistema que necessitem de testes/analises, mas não estão dentro dos requisitos iniciais, ou seja, telas que não possuem codigo fixo/nome do cd.
- Achar algum problema durante a análise que precisa ser resolvido durante essa etapa do projeto.

Observações

- A data estimada de entrega não teve a analise tecnica do QA em relação as tarefas de desenvolvimento, portanto, a data será refinada de acordo com o crescimento do conhecimento do time com as tarefas e os cenarios que sofrerão alterações técnicas.
- A US05 não tem o processo de testes porque trata-se apenas de jobs que realizam ajustes específicos nos dados do sistema, uma procedure que a tela já esta considerada na US06 e relatórios que serão enviados por e-mail apenas.
